

Opérations de levage




6 décès liés aux opérations de levage sont survenus dans la Compagnie au cours des 10 dernières années.

1




Feu vert sécurité

2



3

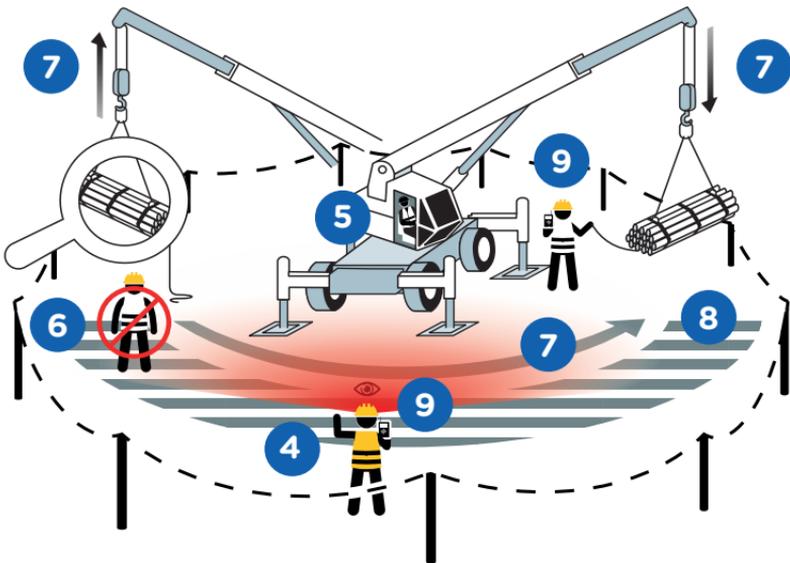

TotalEnergies



Opérations de levage

Lieu _____ Date _____

Entreprise observée _____ N° permis _____



Jun 2022

OUI NON N/A

POINTS À VÉRIFIER

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | La vérification « Feu vert sécurité » a-t-elle été réalisée ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | Un dossier de levage approuvé est-il disponible ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | La liste des contrôles avant démarrage a-t-elle été réalisée par l'équipe intervenante au début du chantier ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Un signaleur / chef de manœuvre est-il désigné et identifiable ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | L'opérateur de l'appareil de levage possède-t-il un certificat de formation / un document d'autorisation pour opérer l'appareil de levage ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | Une zone interdite d'accès est-elle physiquement établie et aucune personne n'est située sous ou à proximité de la charge suspendue ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | L'opération de levage est-elle exécutée conformément au dessin de levage / procédure pas à pas ? (ex : élingues, zone de départ et d'arrivée, zone survolée) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Est-ce qu'aucun équipement sous pression n'est présent sous ou à proximité de la charge suspendue, sauf cas spécifique prévu dans le dossier de levage ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | La charge mobile est-elle contrôlée pendant le levage ? |

Taux de conformité (Nb OUI/points applicables) : _____ / _____ (_____ %)

Commentaires _____

Nom _____ Entreprise _____

Signature _____
