


# Travaux sur systèmes électriques dé-énergisés



**11 accidents mortels** liés aux travaux sur systèmes alimentés en énergie sont survenus dans la Compagnie au cours des 10 dernières années.

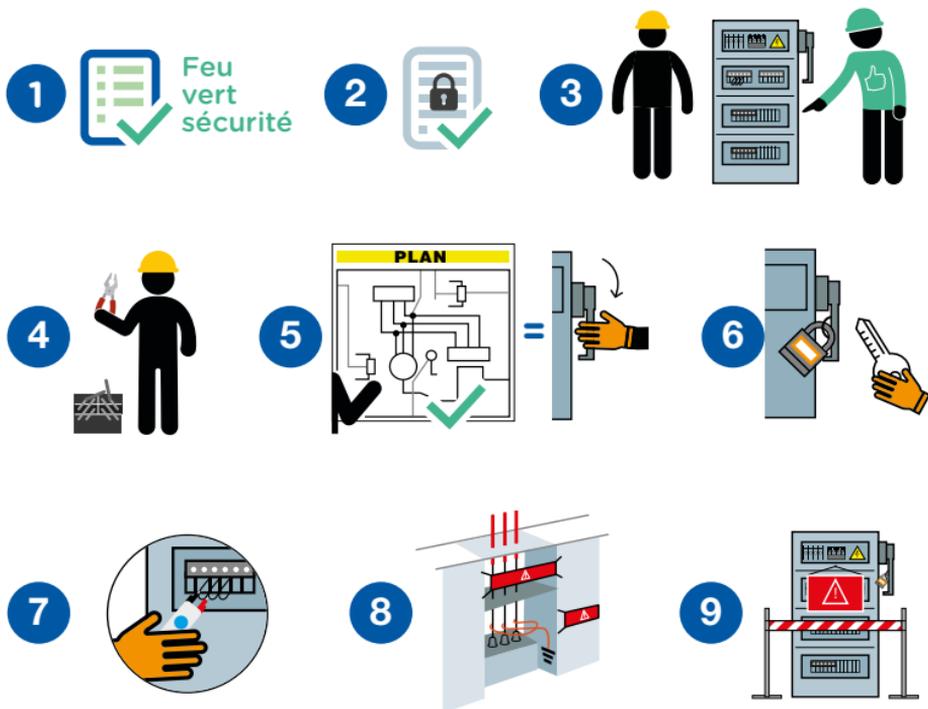

# Travaux sur systèmes électriques dé-énergisés



Jun 2022

Lieu \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Entreprise observée \_\_\_\_\_ N° permis \_\_\_\_\_

OUI NON N/A

## POINTS À VÉRIFIER

**1** La vérification « Feu vert sécurité » a-t-elle été réalisée ?

**2** Le représentant de l'équipe intervenante a-t-il reçu le(s) certificat(s) de consignation validé(s) pour l'équipement concerné par le travail à faire ?

**3** Le circuit ou l'équipement sur lequel le travail doit être effectué est-il identifié sur le terrain par une personne autorisée et en présence du représentant de l'équipe intervenante ?

**4** Le personnel exécutant l'activité est-il muni des EPI spécifiques à la tâche ?

**5** Les dispositifs de séparation sont-ils placés dans la position identifiée par le schéma / plan d'isolement approuvé (documents originaux à consulter dans lieu dédié) ?

**6** Les dispositifs de séparation sont-ils verrouillés et signalés / étiquetés ?

**7** La vérification d'absence de tension a-t-elle été réalisée par une personne autorisée et démontrée au représentant de l'équipe intervenante ?

**8** La mise à la terre / court-circuit a-t-elle été réalisée sur tous les conducteurs y compris le neutre ?

**9** Le danger des éventuelles pièces sous tension voisines est-il signalé et des protections sont-elles en place ?

Taux de conformité (Nb OUI/points applicables): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ %)

Commentaires \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_ Entreprise \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_
