


# Lavori su sistemi procedimento de-energizzato

(gas, liquidi, solidi)



**11 decessi** correlati a lavori su sistemi alimentati con energia si sono verificate nella Compagnia negli ultimi 10 anni.

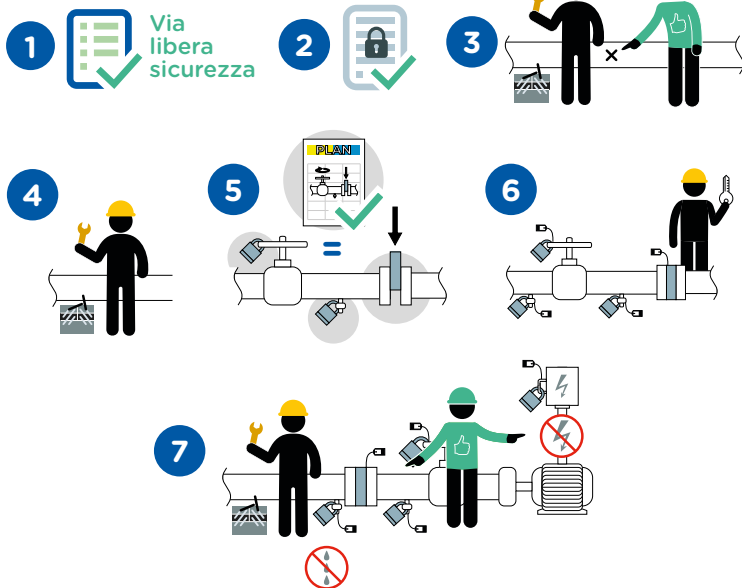

TotalEnergies



# Lavori su sistemi procedimento de-energizzato (gas, liquidi, solidi)



Giugno 2022

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Azienda osservata \_\_\_\_\_ Num. permesso \_\_\_\_\_

SÌ NO N/A

## PUNTI DA CONTROLLARE

**1** La verifica "Via libera sicurezza" è stata realizzata?

**2** Il rappresentante della squadra che interviene ha ricevuto il o i certificati di blocco convalidati per l'attrezzatura relativa al lavoro da fare?

**3** Il circuito o l'attrezzatura su cui deve essere effettuato il lavoro è identificato in campo da una persona autorizzata e in presenza del rappresentante della squadra di intervento?

**4** Il personale che esegue l'attività è munito dei DPI specifici per l'attività e, nelle zone ad atmosfera potenzialmente esplosiva, di attrezzi antiscintilla?

**5** I dispositivi di isolamento sono collocati nella posizione identificata dallo schema/piano di isolamento approvato? (documenti originali da consultare in un luogo apposito)

**6** I dispositivi di isolamento sono bloccati e contrassegnati/etichettati?

**7** L'assenza di energia è stata dimostrata da una persona autorizzata in presenza del rappresentante della squadra d'intervento?

Tasso di conformità (Num. di Sì/punti applicabili): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ %)

Commenti \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Azienda \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_
