


OPÉRATIONS DE LEVAGE

- 1 Feu Vert Sécurité
- 2 Diagramme illustrant la hauteur H et un point de vérification.
- 3 Diagramme illustrant un point de vérification.

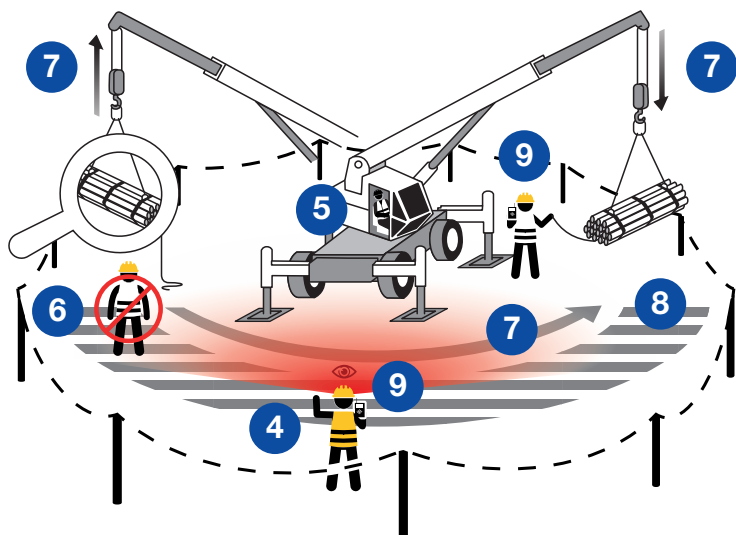

7 décès

liés aux opérations de levage
sont survenus dans le Groupe
au cours des 10 dernières années.

OPÉRATIONS DE LEVAGE



Lieu _____ Date _____

Entreprise observée _____ N° permis _____

OUI NON N/A

POINTS À VÉRIFIER

1 La vérification « Feu Vert Sécurité » a-t-elle été réalisée ?

2 Un plan de levage approuvé est-il disponible ?

3 Les éléments suivants ont-ils été vérifiés :
code couleur et état des éléments de levage,
poids de la charge inférieur à la Charge Maximum
d'Utilisation, moyens de communication définis
et testés, vérification de l'état du sol/du pont ?

4 Un chef de manœuvre est-il désigné et identifiable ?

5 L'opérateur de l'appareil de levage possède-t-il un
certificat de formation et un document d'autorisation
pour opérer l'appareil de levage ?

6 Une zone interdite d'accès est-elle physiquement
établie et aucune personne n'est située sous
ou à proximité de la charge suspendue ?

7 L'opération de levage est-elle exécutée
conformément au plan de levage ? (ex : élingues,
zone de départ et d'arrivée, zone survolée)

8 Est-ce qu'aucun équipement sous pression n'est
présent sous ou à proximité de la charge suspendue,
sauf cas spécifique prévu dans l'analyse de risques ?

9 La charge mobile est-elle contrôlée
pendant le levage ?

Taux de conformité (Nb OUI/points applicables): _____ / _____ (_____ %)

Commentaires _____

Nom _____ Entreprise _____

Signature _____
