


Travaux sur systèmes procédé dé-énergisés (gaz, liquides, solides)



11 décès liés aux travaux sur systèmes alimentés en énergie sont survenus dans la Compagnie au cours des 10 dernières années.

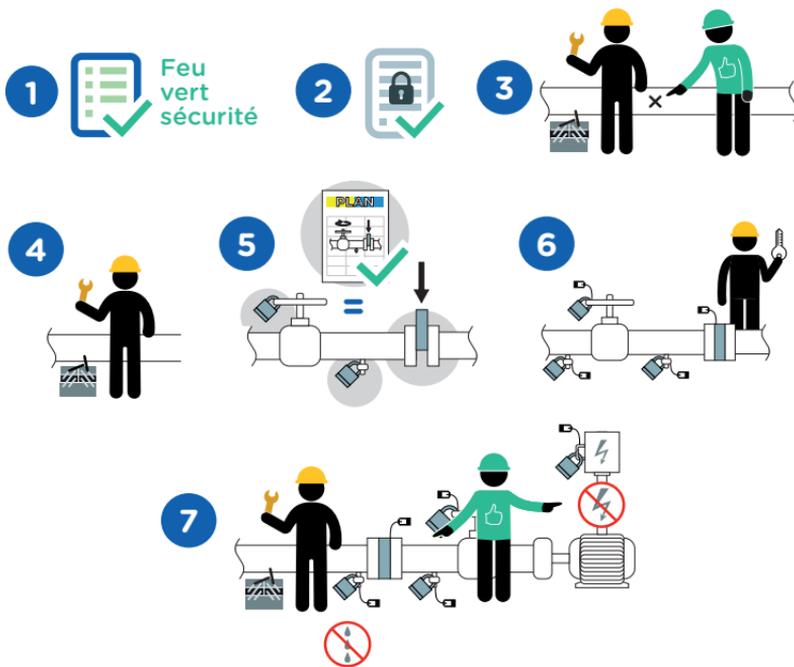

TotalEnergies



Travaux sur systèmes procédé dé-énergisés (gaz, liquides, solides)



Juin 2022

Lieu _____ Date _____

Entreprise observée _____ N° permis _____

OUI NON N/A

POINTS À VÉRIFIER

1 La vérification « Feu vert sécurité » a-t-elle été réalisée ?

2 Le représentant de l'équipe intervenante a-t-il reçu le(s) certificat(s) de consignation validé(s) pour l'équipement concerné par le travail à faire ?

3 Le circuit ou l'équipement sur lequel le travail doit être effectué est-il identifié sur le terrain par une personne autorisée et en présence du représentant de l'équipe intervenante ?

4 Le personnel exécutant l'activité est-il muni des EPI spécifiques à la tâche et, dans les zones à atmosphère potentiellement explosive, d'un outillage anti-étincelant ?

5 Les dispositifs d'isolement sont-ils placés dans la position identifiée par le schéma / plan d'isolement approuvé ? (documents originaux à consulter dans lieu dédié)

6 Les dispositifs d'isolement sont-ils verrouillés et signalés / étiquetés ?

7 L'absence d'énergie a-t-elle été démontrée par une personne autorisée en présence du représentant de l'équipe intervenante ?

Taux de conformité (Nb OUI/points applicables) : _____ / _____ (_____ %)

Commentaires _____

Nom _____ Entreprise _____

Signature _____
